

## 建設型応急住宅の整備について

「令和8年熊本地震」に係る建設型応急住宅について、明日22日(土)に、八代市で1団地35戸、宇土市で1団地17戸及び美里町で1団地40戸の整備に着手することとなりましたので、お知らせします。

今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、318戸(3市3町・15団地)となります。

## ○ 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 団地名称     | (仮称)海士江仮設団地    | (仮称)浦田仮設団地    |
| 所在地      | 八代市海士江町2596    | 宇土市浦田町1番地     |
| 敷地面積     | 約5,375㎡        | 約2,383㎡       |
| 建設戸数     | 35戸            | 17戸           |
| 住宅の構造・階数 | 木造・平屋、木造・2階    | 木造・平屋         |
| 施工者      | (一社)全国木造建設事業協会 | (一社)熊本県優良住宅協会 |
| 入居予定時期   | 10月下旬          | 10月下旬         |
| 備考       | みんなの家(談話室)併設   | 既存の談話室利用      |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 団地名称     | (仮称)町営球技場仮設団地   |
| 所在地      | 下益城郡美里町馬場537番地2 |
| 敷地面積     | 約8,880㎡         |
| 建設戸数     | 40戸             |
| 住宅の構造・階数 | 軽量鉄骨造・平屋        |
| 施工者      | (一社)プレハブ建築協会    |
| 入居予定時期   | 10月中旬           |
| 備考       | みんなの家(談話室)併設    |



(仮称)海士江仮設団地

(仮称)浦田仮設団地  
※市民広場(旧浦田団地跡地)(仮称)町営球技場仮設団地  
※美里町営球技場


※宇土市の浦田仮設団地は、8月22日(土)16時から県職員立会いのもと、縄張り(建物の位置確認)等の作業を実施する予定です。他の2団地については、同日、整地等の作業を開始する予定です。

(裏面あり)

【参 考】 着手済み団地概要 (朱書きは今回分)

| 市町村  | 団地名                 | 戸数   |      | 構造                 | 着手日   | 入居予定<br>時期 | 施工状況 |
|------|---------------------|------|------|--------------------|-------|------------|------|
| 八代市  | (仮称) 毘舎丸仮設団地        | 18戸  | 104戸 | 木造平屋               | 8月11日 | 10月上旬      | 基礎工事 |
|      | (仮称) 鏡町仮設団地         | 17戸  |      | 木造平屋               | 8月18日 | 10月中旬      | 基礎工事 |
|      | (仮称) 植柳上仮設団地        | 34戸  |      | 木造2階               | 8月18日 | 10月中旬      | 基礎工事 |
|      | (仮称) 海士江仮設団地        | 35戸  |      | 木造平屋・<br>木造2階      | 8月22日 | 10月下旬      | -    |
| 宇土市  | (仮称) 浦田仮設団地         | 17戸  | 17戸  | 木造平屋               | 8月22日 | 10月下旬      | -    |
| 宇城市  | (仮称) 当尾仮設団地         | 10戸  | 50戸  | 木造平屋               | 8月3日  | 9月下旬       | 本体工事 |
|      | (仮称) 小川仮設団地         | 30戸  |      | 木造平屋               | 8月3日  | 9月下旬       | 本体工事 |
|      | (仮称) 豊野仮設団地         | 10戸  |      | 木造平屋               | 8月3日  | 9月下旬       | 本体工事 |
| 美里町  | (仮称) 中央庁舎復興団地       | 12戸  | 52戸  | 木造平屋               | 8月9日  | 10月上旬      | 基礎工事 |
|      | (仮称) 町営球技場<br>仮設団地  | 40戸  |      | 軽量鉄骨造<br>平屋        | 8月22日 | 10月中旬      | -    |
| 甲佐町  | (仮称) 乙女仮設団地         | 20戸  | 20戸  | 軽量鉄骨造<br>平屋        | 8月18日 | 10月上旬      | 基礎工事 |
| 氷川町  | (仮称) 吉本仮設団地         | 20戸  | 75戸  | 軽量鉄骨造<br>平屋        | 8月3日  | 9月上旬       | 内装工事 |
|      | (仮称) 宮原防災公園<br>仮設団地 | 24戸  |      | 軽量鉄骨造<br>平屋        | 8月10日 | 9月中旬       | 基礎工事 |
|      | (仮称) 鹿島仮設団地         | 18戸  |      | 軽量鉄骨造<br>平屋        | 8月10日 | 9月中旬       | 本体工事 |
|      | (仮称) 新村仮設団地         | 13戸  |      | 軽量鉄骨造<br>2階        | 8月13日 | 10月上旬      | 基礎工事 |
| 3市3町 | 15団地                | 318戸 |      | (木造183戸・軽量鉄骨造135戸) |       |            |      |

「令和8年熊本地震」に係る仮設住宅団地 建設位置図(8月21日現在)

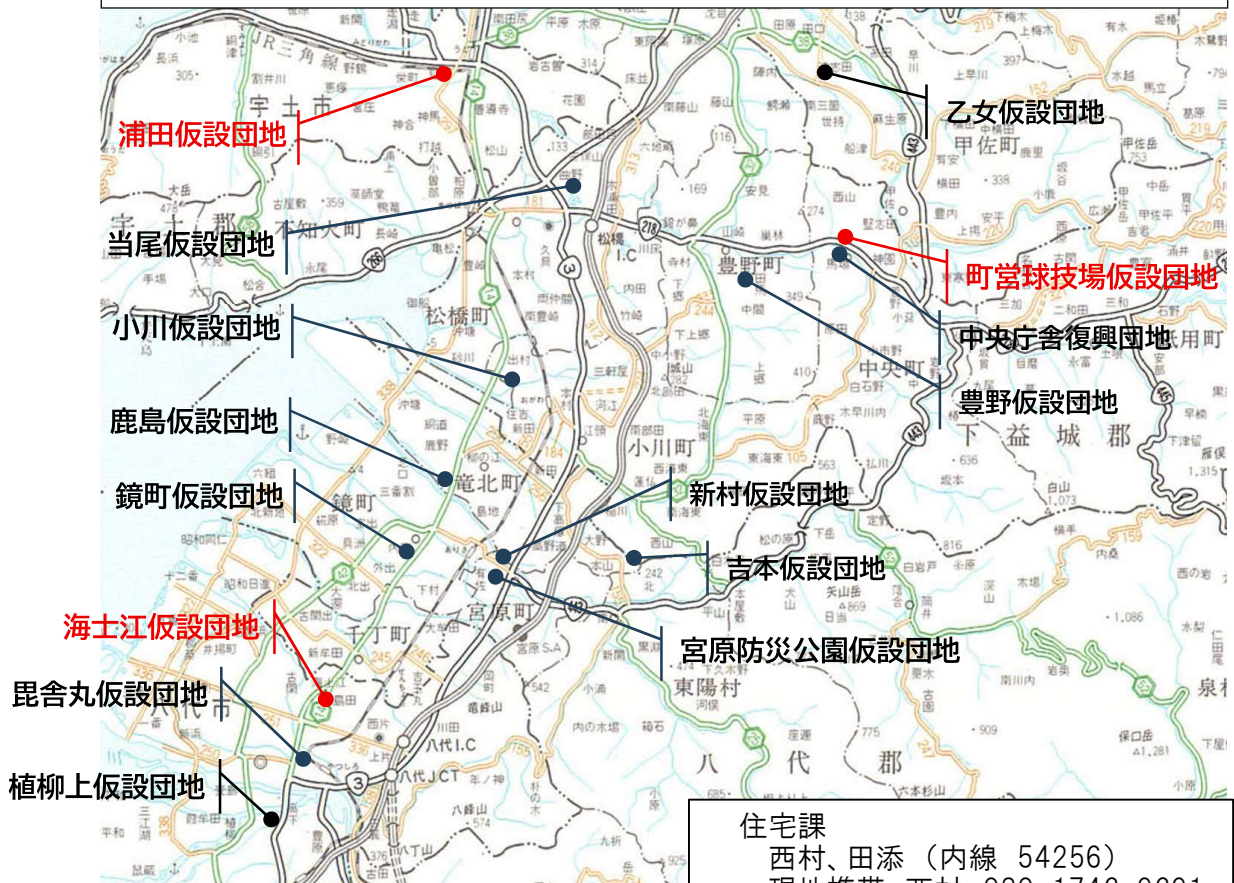

住宅課  
西村、田添 (内線 54256)  
現地携帯 西村 080-1742-9291  
健康福祉政策課  
(すまい対策チーム)  
松永、内野 (内線 33084)
