報道資料

令和２年（２０２０年）１１月１８日

令和２年７月豪雨により県管理河川に堆積した土砂の撤去を進めています

県管理河川の堆積土砂の撤去を行っています

県が管理する河川については、7月豪雨の影響等により、河川内に多量の土砂が堆積しており、これまでの現地調査等の結果、撤去が必要な土量は、おおよそ１００万㎥であることが判明しました。

この堆積した土砂は、河川の流下能力を低下させるものであり、洪水被害を未然に防止するため、速やかに撤去する必要があります。このため、現在、土砂の処分先の確保等の準備が整った箇所から、順次、撤去を進めています。

来年梅雨前までに、住民の皆様に目に見える形で可能な限り堆積土砂の撤去が進むよう、スピード感を持って取組みます。

		（　内 県南地域分　）
１	対 象 河 川：	１２７河川　（　５９河川　）
２	推 定 土 砂 量：	約１００万㎥　（　約８６万㎥　）
３	工事契約済の量：	約　２７万㎥　（　約１７万㎥　）
４	撤 去 済 の 量：	約　９万㎥　（　約　８万㎥　）

※ 各数値は、10月末時点の集計で、簡易的に堆積土砂量を算出したものであり、今後、変更の可能性があります。
また、工事の進捗状況については、定期的に公表します。

※ 国による権限代行分（９河川）については、土砂・流木撤去、河岸防護、土砂止め設置等の緊急的な対策が９月３０日に完了しています。引き続き、被災前の河道確保と被災施設の復旧を実施中であり、当該集計には含まれていません。

（お問い合わせ先）
土木部 河川港湾局 河川課
谷水、池内
（内線）６１３２、６１３１
（直通）０９６－３３３－２５１１

河川掘削状況（１０月末）

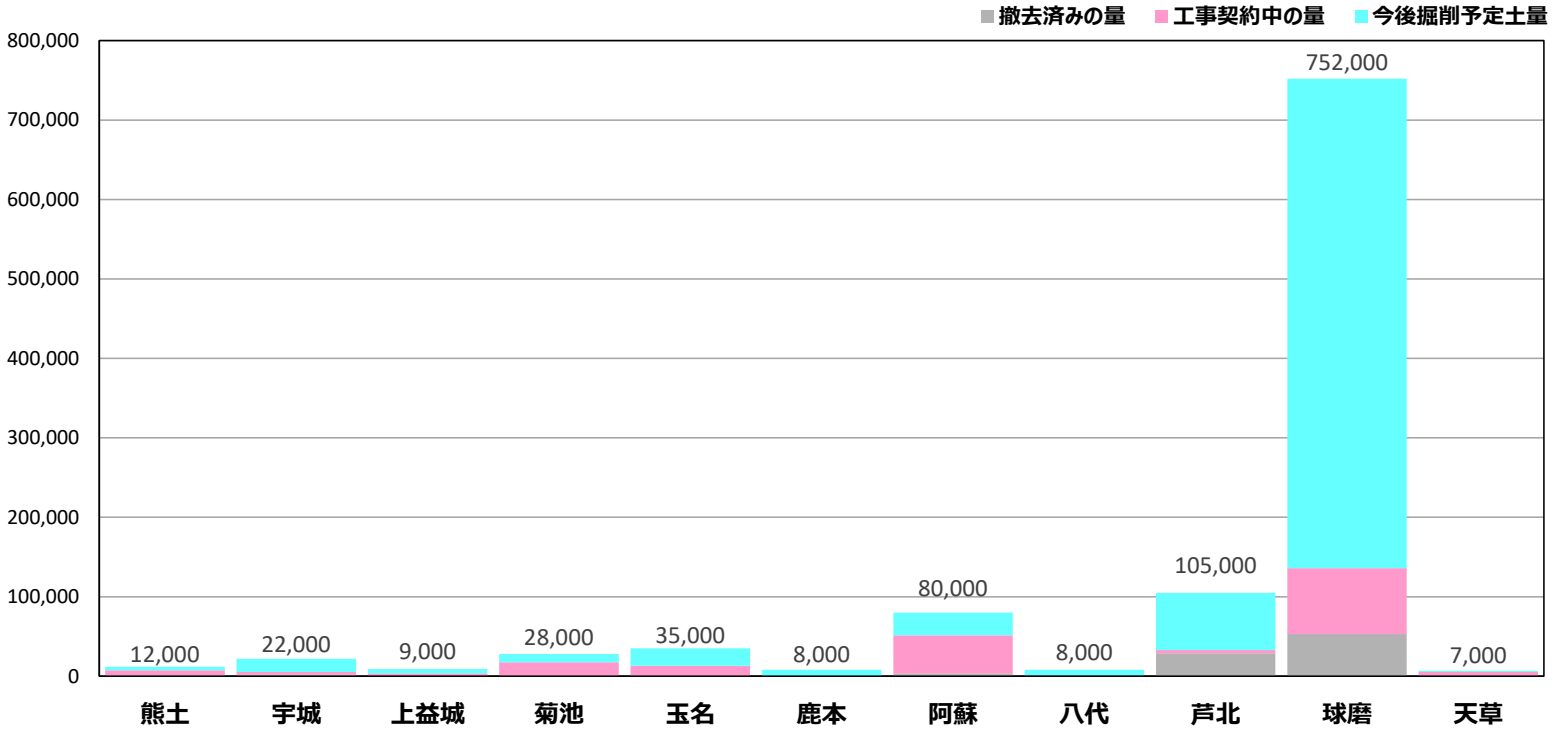

単位：ｍ３

	熊土	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
対象河川数	6	10	8	2	13	5	16	6	20	33	8	127
推定の堆積土砂量　※	12,000	22,000	9,000	28,000	35,000	8,000	80,000	8,000	105,000	752,000	7,000	1,066,000
工事発注済	7,413	5,340	3,300	17,500	13,100	0	51,370	1,021	32,915	136,000	5,355	273,314
工事契約中の土量	7,057	3,450	3,300	17,500	13,100	0	47,872	0	4,100	83,000	5,355	184,734
撤去済みの土量	356	1,890	0	0	0	0	3,498	1,021	28,815	53,000	0	88,580
今後掘削予定土量　※	4,587	16,660	5,700	10,500	21,900	8,000	28,630	6,979	72,085	616,000	1,645	792,686

※各広域本部及び振興局の職員が、現地調査を行い、簡易的に堆積土砂量を算出したものであり、今後、変更の可能性があります。

球磨川流域における河川掘削の進捗状況～１０月末現在～

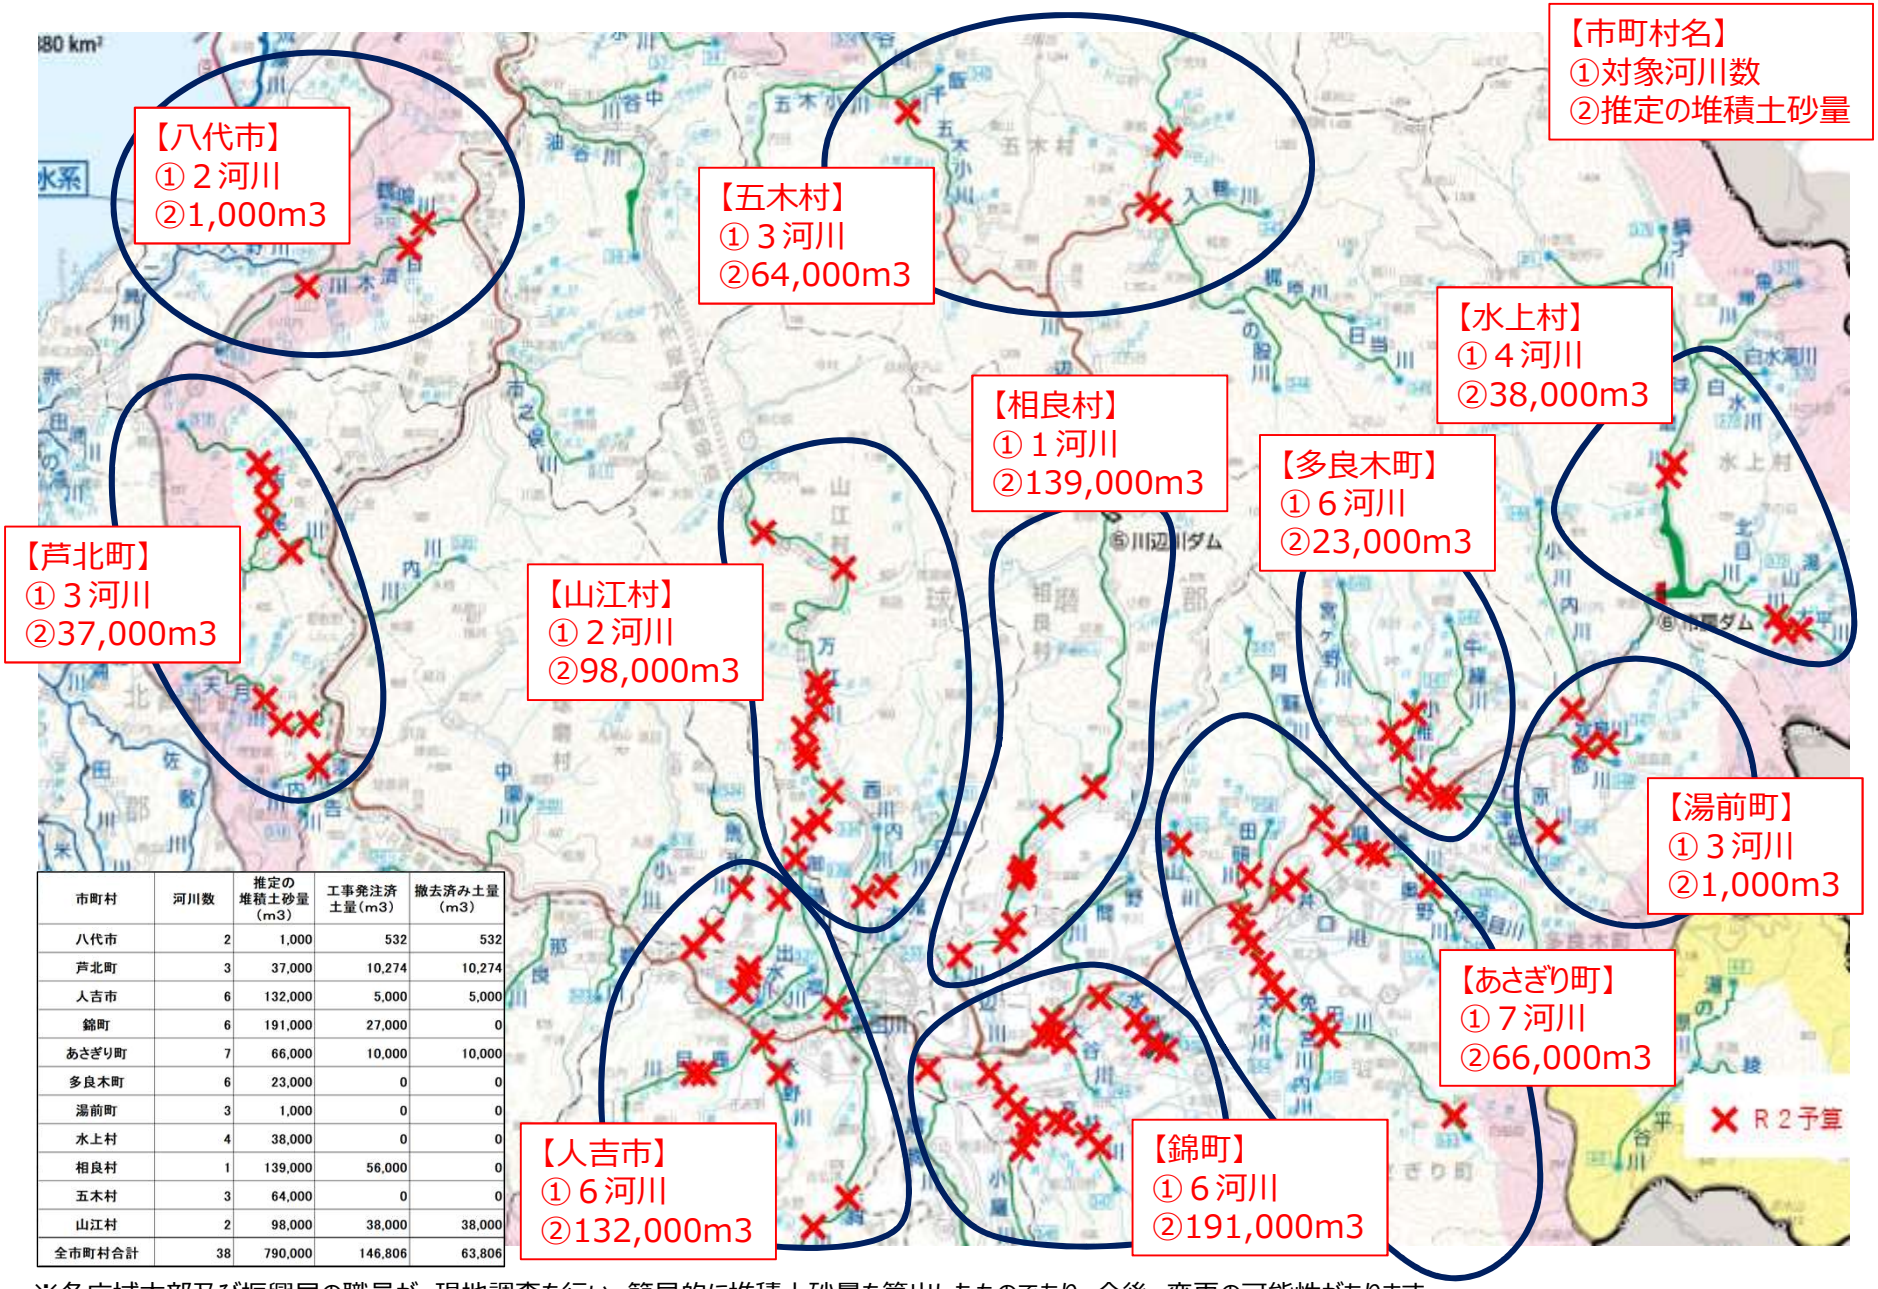

市町村	河川数	推定の堆積土砂量（m3）	工事発注済土量（m3）	撤去済み土量（m3）
八代市	2	1,000	532	532
芦北町	3	37,000	10,274	10,274
人吉市	6	132,000	5,000	5,000
錦町	6	191,000	27,000	0
あさぎり町	7	66,000	10,000	10,000
多良木町	6	23,000	0	0
湯前町	3	1,000	0	0
水上村	4	38,000	0	0
相良村	1	139,000	56,000	0
五木村	3	64,000	0	0
山江村	2	98,000	38,000	38,000
全市町村合計	38	790,000	146,806	63,806

※各広域本部及び振興局の職員が、現地調査を行い、簡易的に堆積土砂量を算出したものであり、今後、変更の可能性があります。

河川掘削の実施状況

①万江川（山江村）

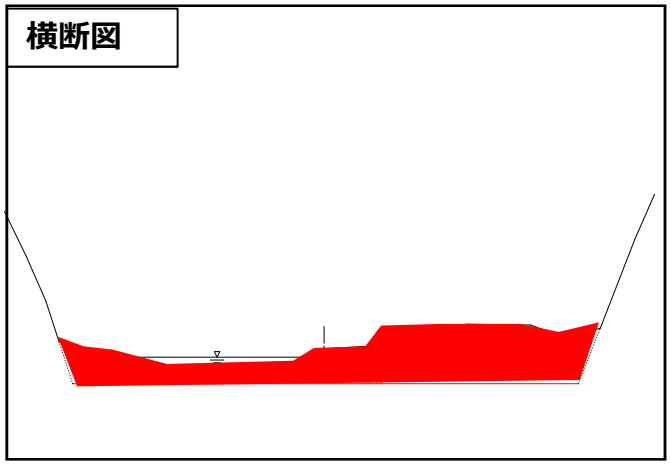

１６.３ｋｍ地点　　８月４日　　１０月１２日

②馬氷川（人吉市）

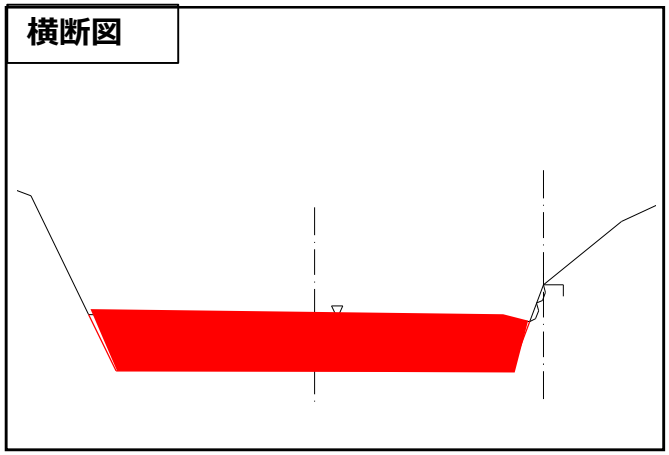

４.１ｋｍ地点　　８月７日　　９月３０日

河川掘削の実施状況

③免田川（あさぎり町）

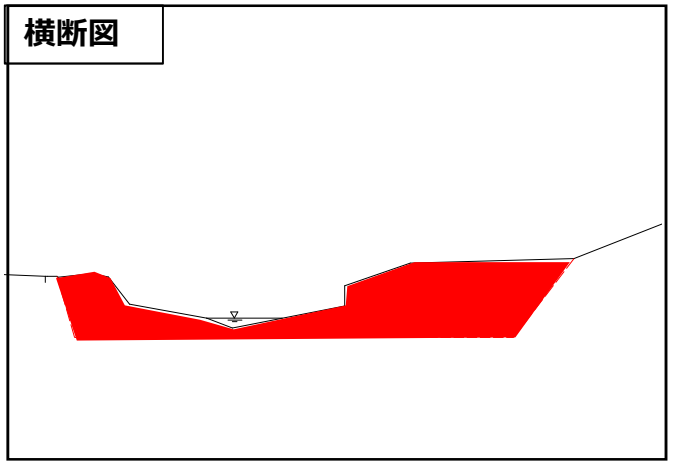

１０.１ｋｍ地点　　7月２０日　　9月２５日

④天月川（芦北町）

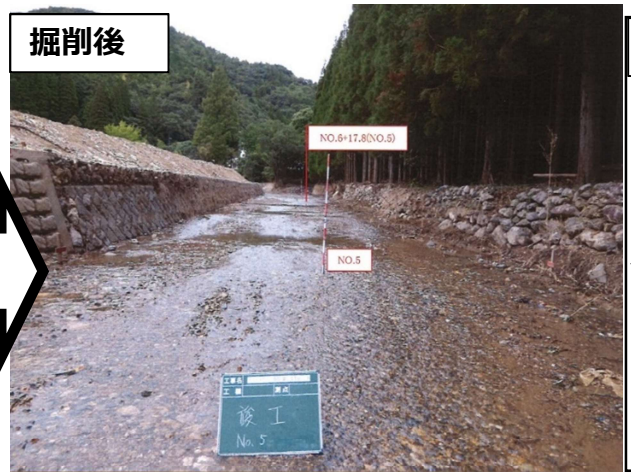

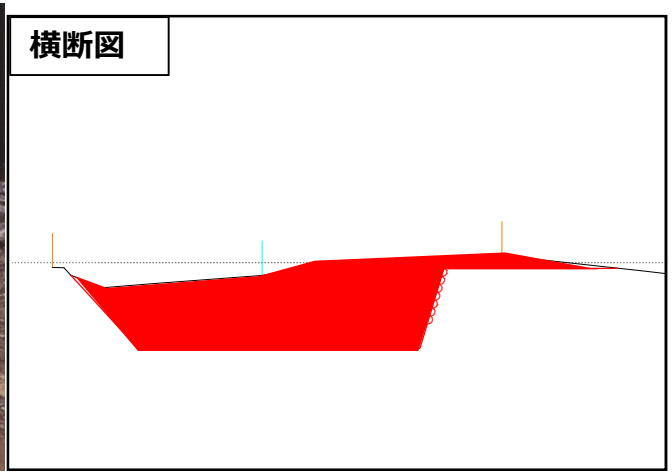

４.０ｋｍ地点　　8月２１日　　9月１日
